

Accetta

Condividi

Altro ▼




- Inserito da Assistenza Air Liquide Web Application alle 29-01-2018 at 12:27:46

Vedere analisi allegata

Stima dell'effort

Analisi tecnica

Sviluppo e gestione
versioning

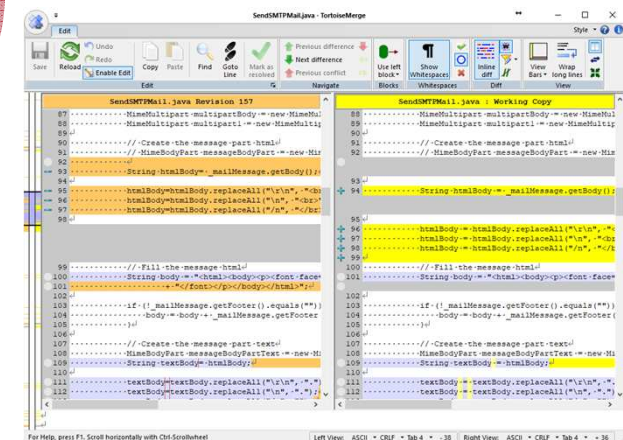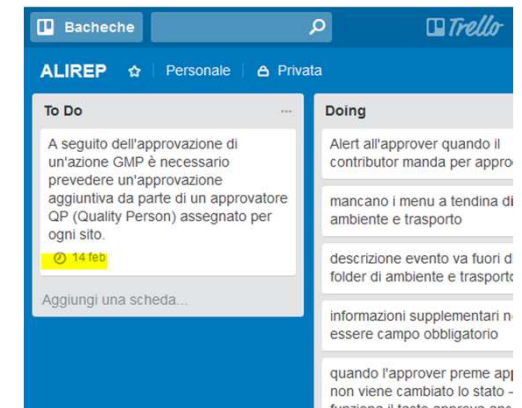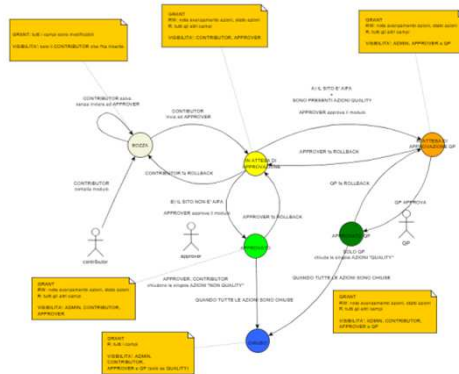

ALL. A2 - ALIRep – Change Management

Ingaggio dello sviluppo tramite CO

- Lo strumento utilizzato, per raccogliere Change Order e ticket di segnalazione bug, è SPICEWORKS. Si tratta di un tool web integrato che permette di gestire sia Help Desk che raccolta di richieste di manutenzione evolutiva.
- La descrizione di dettaglio della CO permette di comprendere i requisiti dell'attività espressi dal cliente
- In aggiunta contiene gli allegati di documentazione e di analisi funzionale formulati dal cliente stesso o dal personale Project
- Tutti i passaggi successivi faranno riferimento al numero di CO assegnato da SPICEWORKS



The screenshot shows the SPICEWORKS Help Desk interface. At the top, there's a navigation bar with 'Help Desk' and other tabs like 'Cruscotto', 'Tickets', 'Knowledge Base', 'Portale Utente', 'Reports', and 'Acc'. Below this is a table of tickets with columns: #, SOMMARIO, ASSEGNATARIO, AUTORE, PRIORITÀ, CREATO, and CHIUSO. Ticket #2611 is highlighted in blue. Below the table, there's a section for ticket #2611 with buttons 'Accetta', 'Condividi', and 'Altro'. The main content area shows the title 'Richiesta Modifica gestione Approvazioni QP' and a description: 'A seguito dell'approvazione di un'azione GMP è necessario prevedere un'approvazione aggiuntiva da parte di un approvatore QP (Quality Person) assegnato per ogni sito.' Below this, there's a section for 'Vedere analisi allegata' and a table with fields: Priorità (Med), Scadenza (Nessuno), Assegnatario (Unassigned), Categoria (Maintenance), Tempo impiega... (0m), and Ultima Attività (2 minutes ago). At the bottom, there are tabs for 'Attività', 'Dettagli', and 'Correlato'.

#	SOMMARIO	ASSEGNATARIO	AUTORE	PRIORITÀ	CREATO	CHIUSO
2611	Richiesta Modifica gestione Approvazio...	Accetta	Assistenza Air ...	Med	29-01-18	
2608	Scansito da una stampante multifunzio...	Assistenza Air ...	graziano.pizzi...	Med	24-01-18	

#2611

Accetta Condividi Altro

Richiesta Modifica gestione Approvazioni QP

- Inserito da Assistenza Air Liquide Web Application alle 29-01-2018 at 12:27:46

A seguito dell'approvazione di un'azione GMP è necessario prevedere un'approvazione aggiuntiva da parte di un approvatore QP (Quality Person) assegnato per ogni sito.

Vedere analisi allegata

Priorità	Scadenza	Assegnatario	Categoria	Tempo impiega...	Ultima Attività
Med	Nessuno	Unassigned	Maintenance	0m	2 minutes ago

Attività Dettagli Correlato

APP. 4 - ALIRep – Change Management

Stima dell'effort

- Una volta valutata la fattibilità tecnica e i macro requisiti per lo sviluppo, siamo in grado di stimare l'effort necessario per la realizzazione dell'attività
- Ci serviamo generalmente di un foglio di calcolo che permette di abbinare ad ogni attività gli effort probabili, i margini di rischio e i tempi legati alle attività accessorie

Area di Lavoro											
ALIREP											
Attività	Effort MAX	Effort MIN	Effort PROB	Effort Previsto	Effort Previsto p	Deviazione Standard 50%	Deviazione Standard 70%	Deviazione Standard 90%	Varianza 50%	Varianza 70%	Varianza 90%
BO - Modificare gestione approvazioni	2	1	2	2	2	0.71	0.50	0.3030303	0.51	0.25	0.0918
DB - aggiunta flag e configurazione sito	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
SYS - gestione doppia approvazione	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Supporto deploy e collaudo in UAT	1	0.5	0.5	1	1	0.36	0.25	0.1515152	0.13	0.06	0.0229
				0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
				0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
				0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
				0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
	5	3.5									
				4	5	1	1	0	1	0	
						1	1	0			

Percentuale di stime in range Min-Max

	50%	70%	90%
Stima 98%	6	6	5
Margine %	35%	25%	15%

Stima scelta: **6**

ALL. A2 - ALIRep – Change Management


Stima dell'effort

■ Al termine della valutazione otteniamo la cifra di effort da comunicare al committente

■ Inoltre aggiungiamo questa stima con una data di rilascio sul tool TRELLO, utilizzato per l'avanzamento SCRUM del progetto

Descrizione Voce di costo : fase di progetto /CR Name / Business Requirement	BR Counter	Stima Sviluppo	Stima Attività Accessore	SW a corpo - Licenze	
ALIREP		6	2	0,0	
		0	0	0,0	
		0	0	0,0	


Totale gg/u	8		
Interni	0	Hp Interni	0
Esterni	0	Hp Esterni	8
Tot. Costi SW e Licenze (K)	0,0		

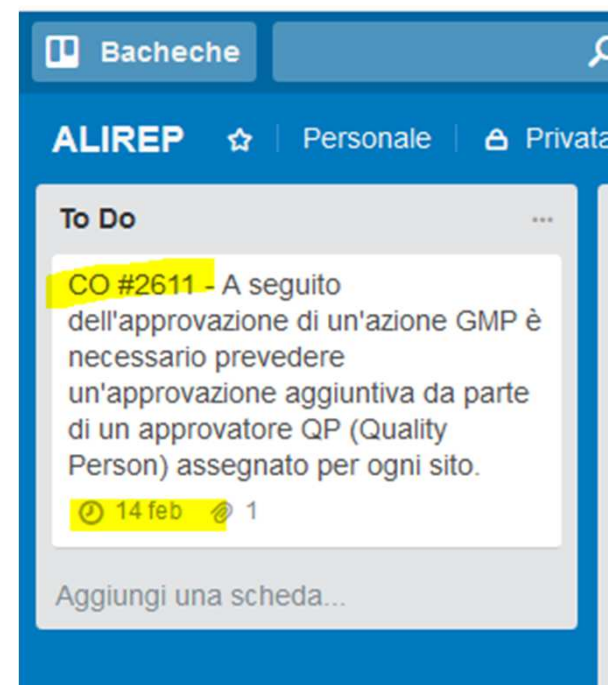

ALL. A2 - ALIRep – Change Management

Analisi Tecnica

- I documenti di progetto prodotti per i nostri progetti open sono principalmente
 - Documenti di analisi tecnica
 - Schemi di architettura
 - Specifiche di colloquio (nel caso si sistemi gateway)
- Informazioni aggiuntive e documenti condivisi di progetto, sono sempre disponibili sul repository SUBVERSION
- I documenti pertinenti ad una CO sono raccolti in una directory di SUBVERSION nominata con il numero della RFC stessa

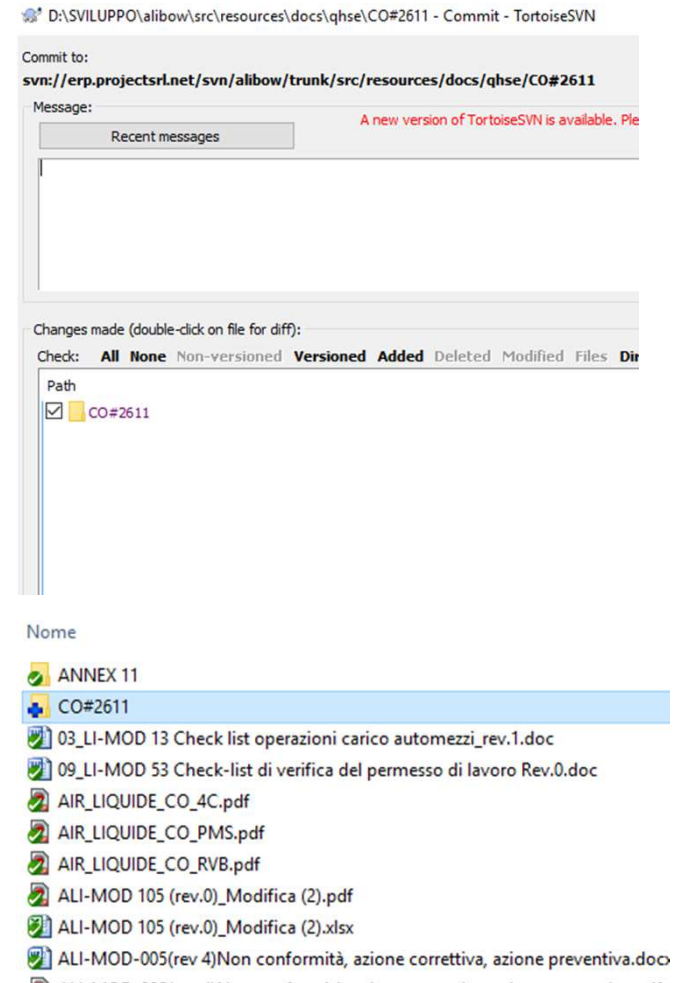

ALL. A2 - ALIRep – Change Management

Sviluppo e Gestione Versioning

- Le attività di sviluppo e gli interventi sul software vengono definite su TRELLO con esplicito riferimento alla CO
- Tramite il collegamento tra TRELLO e SUBVERSION, ad ogni issue creata corrisponde un set di modifiche software evidenziate nell'attività

D:\SVILUPPO\alibow\src\main\jav...\FunctionInserimentoALIMOD20.java - Log Messages - TortoiseSVN

Filter by Messages, Paths, Authors, Revisions, Bug-IDs, Date, Date Range From: 08/11/2017 To: 19/01/2018

Revision	Actions	Author	Date	Message
315		fmoda	venerdì 19 gennaio 2018 08:33:43	QHSE: Alimod 20
309		fmoda	mercoledì 17 gennaio 2018 19:13:01	QHSE: database
276		fmoda	lunedì 15 gennaio 2018 13:14:01	QHSE: Cambio Stato ALIMOD 20
275		fmoda	lunedì 15 gennaio 2018 12:54:06	QHSE: Cambio Stato ALIMOD 20
246		fmoda	giovedì 11 gennaio 2018 08:49:44	QHSE: 20-50-67-80
163		fmoda	lunedì 1 gennaio 2018 10:16:04	Merged revision(s) 63-162 from branches/porting_postgres:
56		fmoda	mercoledì 8 novembre 2017 06:13:34	qhse setup demo

QHSE: Alimod 20

Path	Action	Copy from path	Revision
/trunk/src/main/java/net/projectsrl/qhse/moduli/alimod20/core/FunctionInserimentoALIMOD20.java	Modified		
/trunk/src/main/java/net/projectsrl/qhse/moduli/alimod20/db/Alimod20DettagliDAO.java	Modified		
/trunk/src/main/java/net/projectsrl/qhse/moduli/alimod50/core/FunctionInserimentoALIMOD_base.java	Modified		
/trunk/src/main/java/net/projectsrl/qhse/moduli/alimod80/db/Alimod80DAO.java	Modified		
/trunk/src/main/webapp/WEB-INF/config/config.cfg	Modified		
/trunk/src/main/webapp/WEB-INF/template/home_qhse.html	Modified		
/trunk/src/main/webapp/WEB-INF/template/inserimentoalimod20.html	Modified		
/trunk/src/main/webapp/WEB-INF/template/inserimentoalimod50.html	Modified		
/trunk/src/main/webapp/WEB-INF/template/inserimentoalimod80.html	Modified		
/trunk/src/main/webapp/WEB-INF/template/ricercaalimod20.html	Modified		
/trunk/src/resources/sql/to-do/910-qhse-setup_parametri.sql	Modified		

Showing 7 revision(s), from revision 56 to revision 315 - 1 revision(s) selected, showing 11 changed paths


☐ Show only affected paths
☐ Stop on copy/rename
☐ Include merged revisions

Show All | Next 100 Refresh

Statistics Help OK

ALL. A2 - ALIRep – Change Management

Differenze tra CHANGE ORDER e BUG FIX

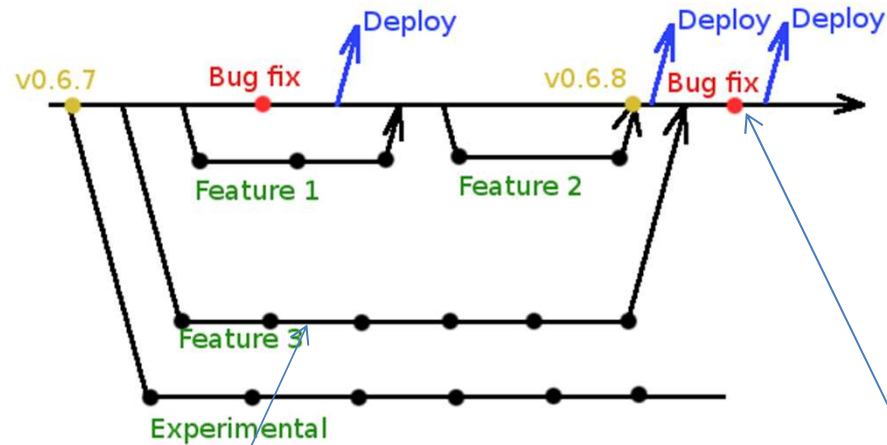

- Ogni modifica legata a un CO è gestita come una nuova feature, su un ramo separato dello sviluppo.
- Viene rilasciata solamente dopo i necessari test di integrazione, e riportata sul ramo principale delle versioni
- Una bug fixing invece viene realizzato direttamente come modifica sul ramo di software principale, che riporta la versione stabile presente in produzione
